

資料番号	11
------	----

令和4年6月9日
課名 土木建築局技術企画課
担当者 課長 木村
内線 3852

## 平成30年7月豪雨に係る災害復旧事業等の進捗状況について

### 1 要旨・目的

平成30年7月豪雨により甚大な被害が発生した公共土木施設の災害復旧事業について、進捗状況と見通し等について報告する。

### 2 現状・背景

平成30年7月豪雨災害からの復旧・復興については、被災された住民の皆様の日常が一日も早く回復するよう、「平成30年7月豪雨災害からの復旧・復興プラン」に基づき、最優先で取り組んでいる。

### 3 概要

#### (1) 対象者

被災された県民・事業者等

#### (2) 事業内容

平成30年7月豪雨により甚大な被害が発生した公共土木施設2,550箇所の災害復旧事業と、三篠川や主要地方道環状線などの改良復旧事業に取り組む。

#### (3) 進捗状況

##### ア 災害復旧事業

災害復旧事業については、改良復旧事業等により実施する箇所を除いた2,523箇所の令和4年5月末時点での進捗状況は表1のとおりである。

##### イ 改良復旧事業

改良復旧事業については、令和5年度中の事業完了を目指しており、令和4年5月末時点での進捗状況は表2のとおりである。

表1 災害復旧事業の進捗状況

(単位：箇所)

建設事務所（支所）等	災害復旧事業被災箇所数（査定決定ベース）		
		契約済	
		完成	
西部	462	462	399
呉	219	219	178
廿日市	11	11	11
安芸太田	29	29	29
東広島	515	515	402
東部	450	450	450
三原	457	457	449
北部	141	141	141
庄原	236	236	206
広島水道	3	3	3
全体 (改良復旧事業等により実施する箇所を除く)	2,523	2,523 (100%)	2,268 (90%)
(全体) (改良復旧事業等を含む)	(2,550)	(2,547)	(2,281)

表2 改良復旧事業の進捗状況

区分	事業名	進捗状況（予定を含む）			完了目標
		用地	工事（工事数量に対する割合）		
			契約	完了	
道路	主要地方道 呉環状線【災害関連事業】	境界立会：100% 用地取得：45% (工事施工承諾含み100%)	護岸工：100% 法面工：100% 橋梁下部工：100% 橋梁上部工：100% 舗装工：100%	護岸工：86% 法面工：76% 橋梁下部工：29% 橋梁上部工：0% 舗装工：0%	令和4年度中
河川	沼田川及びその支川 【河川激甚災害対策 特別緊急事業】	境界立会：100% 用地取得：100%	護岸工：61% 掘削工：82% 築堤工：100% 堰改築工：100%	護岸工：58% 掘削工：82% 築堤工：98% 堰改築工：0%	令和4年度中 *堰改築工のうち 本土工については 令和4年5月に完了
	三篠川 【災害復旧助成事業】	境界立会：99% 用地取得：82%	護岸工：62%	護岸工：43%	令和5年度中
砂防	ひよき川 【災害関連事業】	境界立会：100% 用地取得：100%	渓流保全工：100% 橋梁工：100%	渓流保全工：50% 橋梁工：0%	令和4年度中

(4) 予算（国庫）

災害復旧事業	:	14,180 百万円
改良復旧事業 【呉環状線】	:	220 百万円
〃 【三篠川】	:	7,158 百万円
〃 【沼田川】	:	1,894 百万円
〃 【ひよき川】	:	59 百万円

※予算は令和4年度事故繰越，明許繰越，当初予算の合計

(5) 今後の対応

梅雨を迎えるにあたり，工事が完成しない箇所については，工事現場の点検を行い，応急対応として設置している土のうの修繕や再設置などを必要に応じて行ったところであり，市町や自治会などと現場の状況を共有するなどし，降雨時の早期避難等につながるよう適切に取り組む。

また，工事が完成しない箇所において，省力化が図られるコンクリート二次製品の更なる活用や工期短縮に資する工法への変更，令和3年10月に導入した創意工夫により工期短縮を行った建設事業者に対して工事成績評定点を加点する取組の再周知，関係団体等を通じた手持ち工事量が比較的少ない地域からの下請参加の協力要請など，引き続き，必要な対策を講じながら，早期完成に向けて取り組む。

《令和4年5月に完成した災害復旧事業の一例》



(砂) 太田川（呉市音戸町）



(一) 小鳥原川（庄原市西城町）

(参考 改良復旧事業の進捗状況の詳細)

(1) 主要地方道 呉環状線 災害関連事業


主要地方道呉環状線については、現在、用地取得を進めるとともに、工事については令和4年5月末時点で護岸工が約9割、法面工が約8割完了している。

また、護岸工が完成した一部区間については、道路拡幅工事を完成させ部分供用を行っている。


現在進めている、法面や橋梁工事等については、引き続き、適切な工程管理等を行い、令和4年度中の完成を目指し事業執行を図る。

《主要地方道 呉環状線【災害関連事業】の進捗状況》

【平面図】

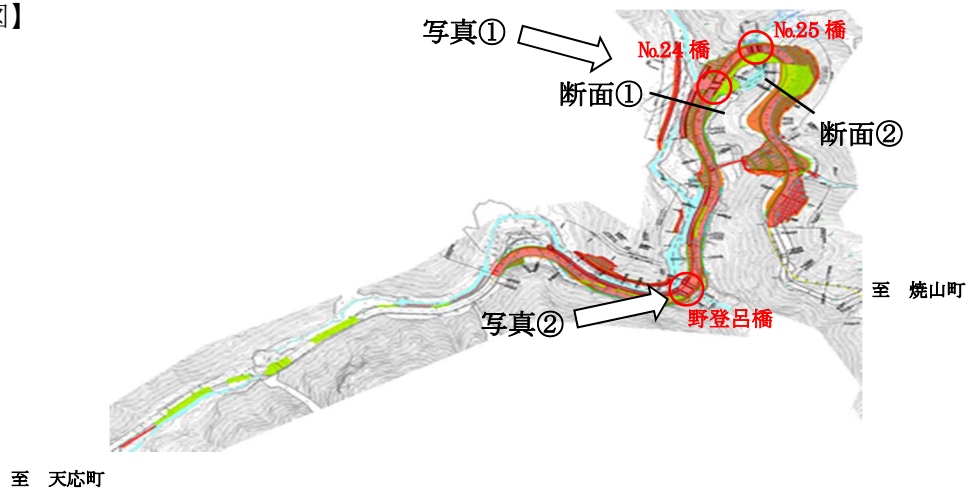


【断面①】

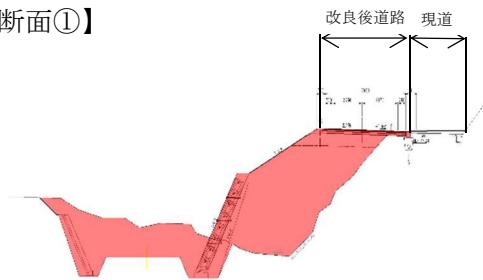

写真①法面工，橋梁下部工施工状況



【断面②】

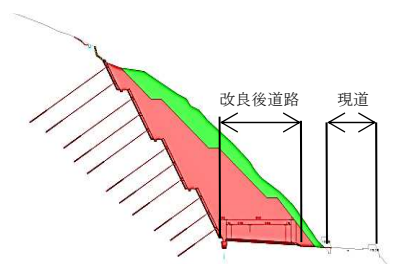

写真②橋梁下部工施工状況





## (2) 沼田川及びその支川 河川激甚災害対策特別緊急事業

沼田川及びその支川については、沼田川本川では河道掘削，支川の菅川では築堤，天井川では護岸のかさ上げなどの工事を順次進めており，令和4年5月末で護岸工が約6割，築堤工が約9割完了している。

なお，本川において<sup>きざんがけ</sup>茶山涯頭首工の堰本体工の工事が5月に完了し，天井川の家屋連担区間及び菅川の工事は6月末までに完了見込である。

本川，仏通寺川及び天井川の残工事については，引き続き，各工区の適切な工程管理等を行い，令和4年度中の完成を目指し事業執行を図る。

### 《沼田川【河川激甚災害対策特別緊急事業】の進捗状況》

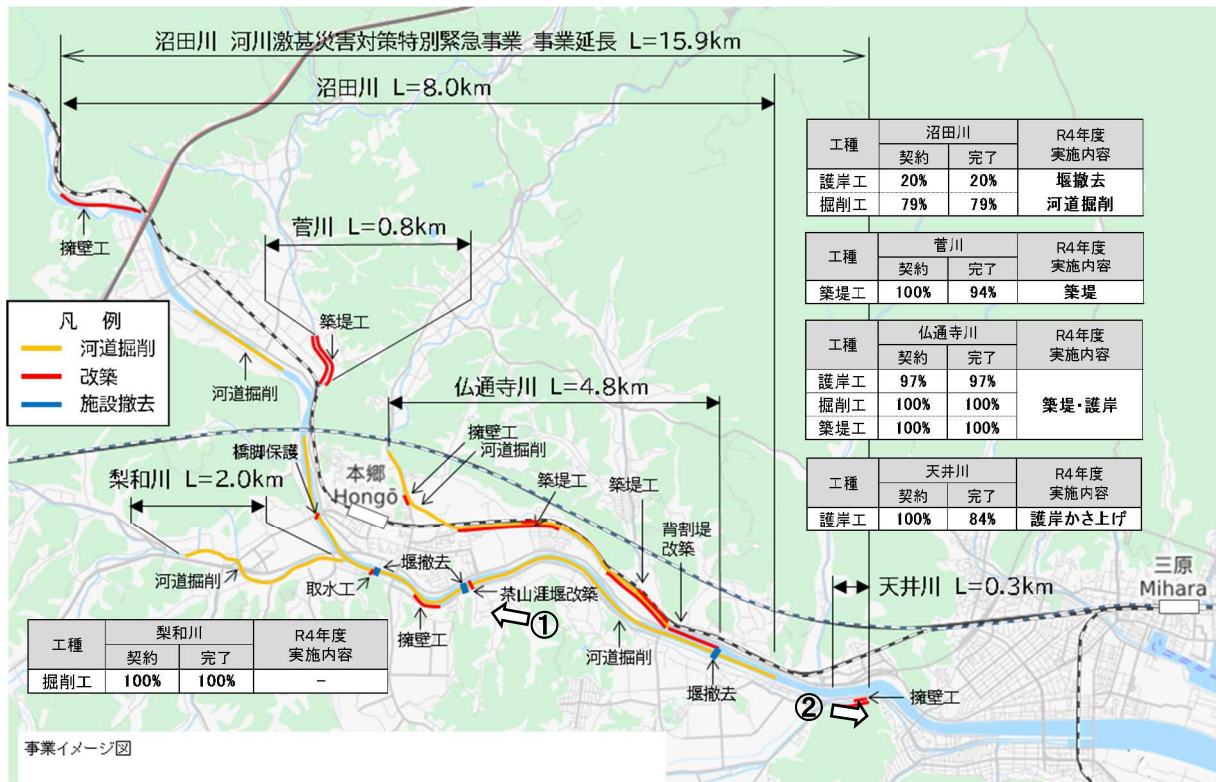

①沼田川（堰改築状況）



②天井川（擁壁工施工状況）




### (3) 三篠川 災害復旧助成事業

三篠川については、改良復旧を予定している全5区間において、用地取得を進めるとともに、築堤・護岸整備や河道拡幅、河道掘削などの工事を順次進めており、令和4年5月末で護岸工が約4割完了している。


引き続き、関係者に丁寧な説明を行うとともに、適切に工程管理等を行い、計画的に事業執行を図る。

#### 《三篠川【災害復旧助成事業】の進捗状況》

##### 【平面図】

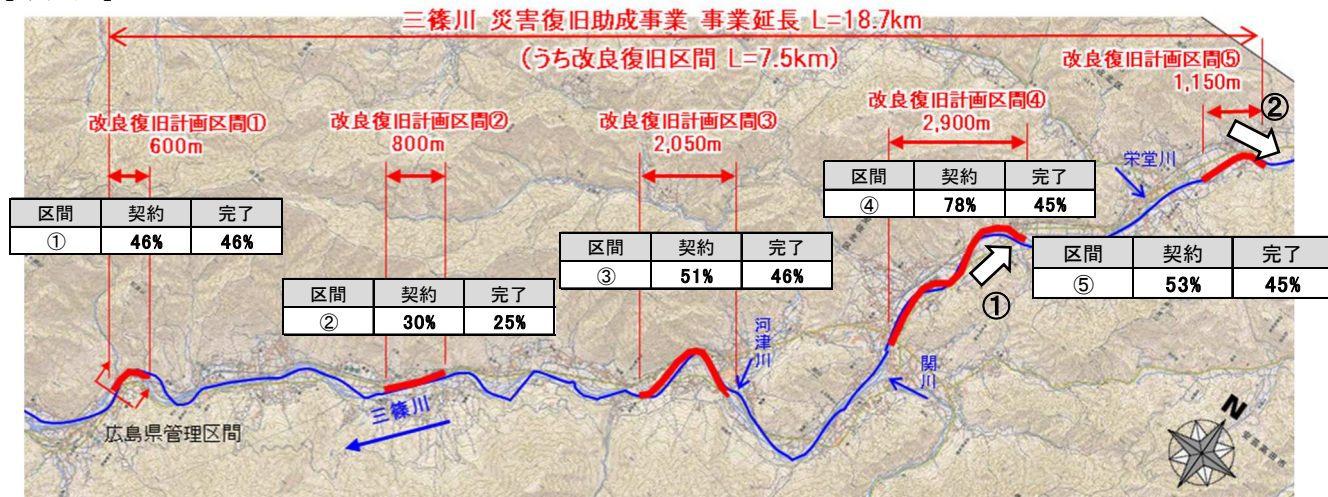

##### 事業イメージ図






#### (4) ひよき川 砂防施設災害関連事業

ひよき川については、工事契約が完了し、順次工事に着手しており、令和4年5月末で約5割完了している。

現在、他地域からの施工業者に加え、他県の下請け業者も活用しており、引き続き、各工区の適切な工程管理等を行い、令和4年度中の完成を目指し事業執行を図る。

#### 《ひよき川【災害関連事業】の進捗状況》

##### 【平面図】

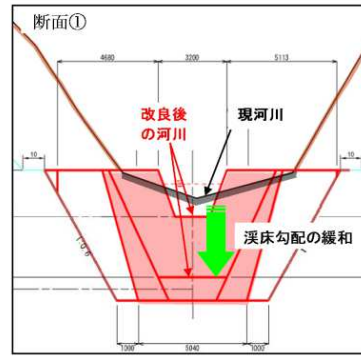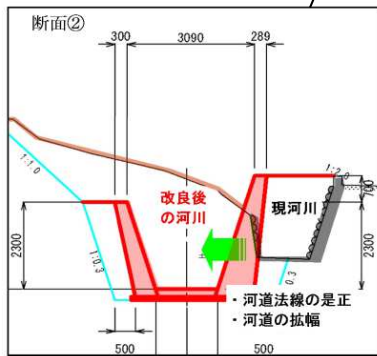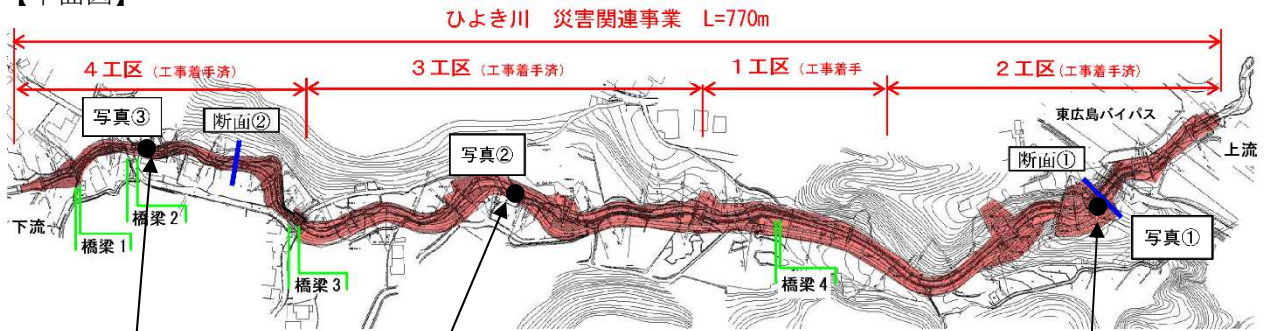

写真②



写真①



写真③

