


# 巖島港 宮島口地区港湾整備事業 埋立工事進捗状況（H25年10月）



捨石投入状況

平成25年9月17日から汚濁防止膜の設置に着手し、工事は順調に進捗しています

10月末時点で、床掘、捨石投入、均しが完了し、11月からはケーソン・直立消波ブロックの据付工事を行います。

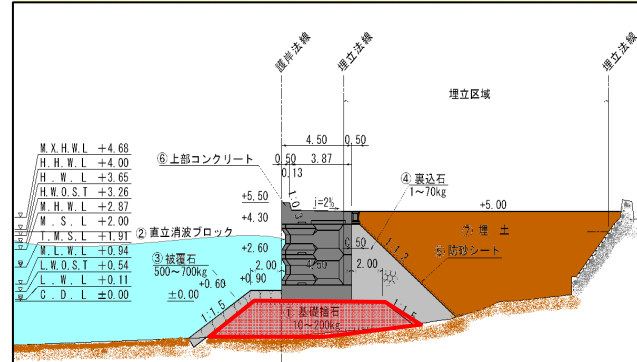

捨石投入状況（沖に停泊した運搬船から、作業船に積替えて捨石投入作業を行いました。）



据付を待つケーソン（左）と直立消波ブロック（右）

広島県西部建設事務所  
廿日市支所 巖島港整備課
