

| | |
|------|---|
| 資料番号 | 1 |
|------|---|

| |
|---------------|
| 令和3年7月19日 |
| 課名 土木建築局技術企画課 |
| 担当者 課長 木村 |
| 内線 3852 |

平成30年7月豪雨に係る災害復旧事業等の進捗状況について

1 要旨・目的

平成30年7月豪雨により甚大な被害が発生した公共土木施設の災害復旧事業について、進捗状況と見通し等について報告する。

2 現状・背景

平成30年7月豪雨災害からの復旧・復興については、被災された住民の皆様の日常が一日も早く回復するよう、「平成30年7月豪雨災害からの復旧・復興プラン」に基づき、最優先で取り組んでいる。

3 概要

(1) 対象者

被災された県民・事業者等

(2) 事業内容

平成30年7月豪雨により甚大な被害が発生した公共土木施設2,550箇所の災害復旧事業と、三篠川や主要地方道呉環状線などの改良復旧事業に取り組む。

(3) 進捗状況

ア 災害復旧事業

災害復旧事業は令和3年度中の完成を目指しており、改良復旧事業等により実施する箇所を除いた2,523箇所の令和3年6月末時点での進捗状況は表1のとおりである。

イ 改良復旧事業

改良復旧事業については、令和5年度中の事業完了を目指しており、令和3年6月末時点での進捗状況は表2のとおりである。

表1 災害復旧事業の進捗状況

(単位：箇所)

| 建設事務所（支所） 等 | 災害復旧事業被災箇所数（査定決定ベース） | | | |
|---------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|----------------|
| | | 発注済 ^{※1} | | 完成 |
| | | | 契約済 | |
| 西部 | 462 | 452 | 452 | 276 |
| 呉 | 219 | 219 | 219 | 144 |
| 廿日市 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 安芸太田 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 東広島 | 515 | 513 | 508 | 295 |
| 東部 | 450 | 450 | 450 | 421 |
| 三原 | 457 | 457 | 457 | 364 |
| 北部 | 141 | 141 | 141 | 138 |
| 庄原 | 236 | 236 | 236 | 163 |
| 広島水道 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 全体 (改良復旧事業等により実施 する箇所を除く) | 2,523 | 2,511 (99%) | 2,506 (99%) | 1,844 (73%) |
| (全体) (改良復旧事業等を含む) | (2,550) | (2,528) | (2,523) | (1,849) |

(※1) 公告または指名通知済のもの。

表2 改良復旧事業の進捗状況

| 区分 | 事業名 | 進捗状況（予定を含む） | | | 完了目標 |
|----|-----------------------------------|--|--|--|--------|
| | | 用地 | 工事（工事数量に対する割合） | | |
| | | | 契約 | 完了 | |
| 道路 | 主要地方道 呉環状線【災害関連事業】 | 境界立会：100% 用地取得：8.6% (工事施工承諾含み100%) | 護岸工：100% 法面工：100% 橋梁下部工：100% 橋梁上部工：0% 舗装工：0% | 護岸工：83% 法面工：31% 橋梁下部工：0% 橋梁上部工：0% 舗装工：0% | 令和4年度中 |
| 河川 | 沼田川及びその支川 【河川激甚災害対策 特別緊急事業】 | 境界立会：100% 用地取得：100% | 護岸工：35% 掘削工：77% 築堤工：80% 堰改築工：100% | 護岸工：35% 掘削工：77% 築堤工：4% 堰改築工：0% | 令和4年度中 |
| | 三篠川 【災害復旧助成事業】 | 境界立会：98% 用地取得：68% | 護岸工：46% | 護岸工：16% | 令和5年度中 |
| 砂防 | ひよき川 【災害関連事業】 | 境界立会：100% 用地取得：99% | 溪流保全工：100% 橋梁工：50% | 溪流保全工：11% 橋梁工：0% | 令和3年度中 |

(4) 予算

| | | |
|---------------|---|-----------------------|
| 災害復旧事業 | : | 21,935 百万円 (繰越予算) |
| 改良復旧事業 【呉環状線】 | : | 608 百万円 (繰越予算) |
| " 【三篠川】 | : | 3,490 百万円 (令和3年度当初予算) |
| " 【沼田川】 | : | 1,050 百万円 (令和2年度2月補正) |
| " 【ひよき川】 | : | 178 百万円 (繰越予算) |

(5) 今後の対応

平成30年7月豪雨に係る災害復旧事業の実施箇所のうち、人家に近接した箇所など県民生活に影響の大きい1,397箇所については、6月末時点で1,388箇所が完成し、完成していない9箇所については、大型土のうや袋詰玉石の設置など、出水期中に必要な安全対策を実施しており、引き続き早期完成に向けて取り組む。

一方で、依然として地域内事業者の手持ち工事量が多く、下請業者の確保が困難な状況が続いており、西部建設事務所及び西部建設事務所東広島支所管内において一部の工事に遅れが生じている。

このため、引き続き工事の稼働状況を市町工事も含めて、より詳細に把握し、関係団体等を通じ手持ち工事量が比較的少ない地域から下請業者の確保が困難な地域への下請け参加などの協力要請を行っている。

また、工事箇所ごとの現場条件を詳細に把握した上で、工期短縮・省力化に資する二次製品や工法を積極的に活用することにより事業の進捗を図り、令和3年度中の完成を目指す。

《令和3年6月に完成した災害復旧事業の一例》




(一) 亀谷川 (庄原市総領町)



(一) 板木川 (三次市下志和地町)

《令和3年6月の改良復旧事業の状況》

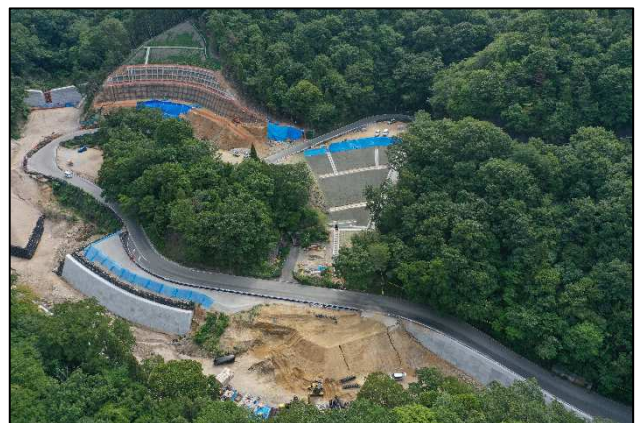

(主) 呉環状線 (呉市焼山町)
