

資料番号	8
------	---

令和4年5月19日
課名 土木建築局技術企画課
担当者 課長 木村
内線 3852

## 平成30年7月豪雨に係る災害復旧事業等の進捗状況について

### 1 要旨・目的

平成30年7月豪雨により甚大な被害が発生した公共土木施設の災害復旧事業について、進捗状況と見通し等について報告する。

### 2 現状・背景

平成30年7月豪雨災害からの復旧・復興については、被災された住民の皆様の日常が一日も早く回復するよう、「平成30年7月豪雨災害からの復旧・復興プラン」に基づき、最優先で取り組んでいる。

### 3 概要

#### (1) 対象者

被災された県民・事業者等

#### (2) 事業内容

平成30年7月豪雨により甚大な被害が発生した公共土木施設2,550箇所の災害復旧事業と、三篠川や主要地方道環状線などの改良復旧事業に取り組む。

#### (3) 進捗状況

##### ア 災害復旧事業

災害復旧事業については、改良復旧事業等により実施する箇所を除いた2,523箇所の令和4年4月末時点での進捗状況は表1のとおりである。

##### イ 改良復旧事業

改良復旧事業については、令和5年度中の事業完了を目指しており、令和4年4月末時点での進捗状況は表2のとおりである。

表1 災害復旧事業の進捗状況

(単位：箇所)

建設事務所（支所）等	災害復旧事業被災箇所数（査定決定ベース）		
		契約済	
		完成	
西部	462	462	390
呉	219	219	176
廿日市	11	11	11
安芸太田	29	29	29
東広島	515	515	395
東部	450	450	450
三原	457	457	447
北部	141	141	141
庄原	236	236	201
広島水道	3	3	3
全体 (改良復旧事業等により実施する箇所を除く)	2,523	2,523 (100%)	2,243 (89%)
(全体) (改良復旧事業等を含む)	(2,550)	(2,547)	(2,256)

表2 改良復旧事業の進捗状況

区分	事業名	進捗状況（予定を含む）			完了目標
		用地	工事（工事数量に対する割合）		
			契約	完了	
道路	主要地方道 呉環状線【災害関連事業】	境界立会：100% 用地取得：45% (工事施工承諾含み100%)	護岸工：100% 法面工：100% 橋梁下部工：100% 橋梁上部工：100% 舗装工：100%	護岸工：86% 法面工：76% 橋梁下部工：21% 橋梁上部工：0% 舗装工：0%	令和4年度中
河川	沼田川及びその支川 【河川激甚災害対策 特別緊急事業】	境界立会：100% 用地取得：100%	護岸工：61% 掘削工：82% 築堤工：100% 堰改築工：100%	護岸工：57% 掘削工：82% 築堤工：95% 堰改築工：0%	令和4年度中
	三篠川 【災害復旧助成事業】	境界立会：99% 用地取得：82%	護岸工：62%	護岸工：41%	令和5年度中
砂防	ひよき川 【災害関連事業】	境界立会：100% 用地取得：100%	溪流保全工：100% 橋梁工：100%	溪流保全工：48% 橋梁工：0%	令和4年度中

(4) 予算（国庫）

令和4年度当初予算

改良復旧事業 【三篠川】 : 2,452 百万円

〃 【沼田川】 : 721 百万円

※令和3年度からの繰越予算については整理中

(5) 今後の対応

未完成箇所については、省力化が図られるコンクリート二次製品の更なる活用や工期短縮に資する工法への変更、関係団体等を通じた手持ち工事量が比較的少ない地域から下請参加の協力要請など、引き続き、必要な対策を講じながら、早期完成に向けて取り組む。

また、出水期までに完成しない箇所については、工事現場の点検を行い、応急対応として設置している土のうの修繕や再設置を必要に応じて行うとともに、市町や自治会などと現場の状況を共有するなど、周辺住民の不安を軽減できるよう適切に取り組む。

《令和4年4月に完成した災害復旧事業の一例》




(二) 大元谷川（広島市安芸区）



(二) 蛇道川（東広島市安芸津町）

《令和4年4月の改良復旧事業の状況》

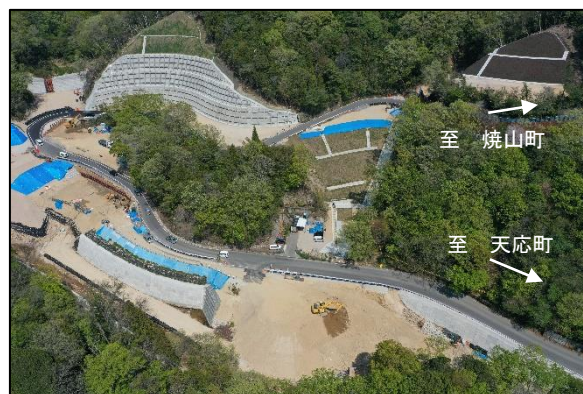

(主) 呉環状線（呉市焼山町）
