

「むろのき通信」 第39号

～鞆町内の広島県と福山市の事業についてお知らせします～

2024（令和6）.8.21


発行：広島県東部建設事務所
 鞆地区まちづくり推進事業所（084-921-1311）
 鞆出張所（084-982-2701）
 福山市建設局土木部港湾河川課（084-928-1260）

鞆未来トンネルの進捗状況について

6月28日に貫通した鞆未来トンネルでは、覆工コンクリートの打設を進めています。これまで御幸地区・平地区から2基のスライドセントルで打設を行っていましたが、7月からは拡幅部（御幸側出口付近や非常駐車帯）においても、新たにスライドセントル（大型）を配置し、3基体制で打設を進めています。




また、これまでトンネル掘削の為に使用していた大型重機や仮設備などの撤去を行いました。この1年半、見慣れていた機械なので少し寂しく感じています。

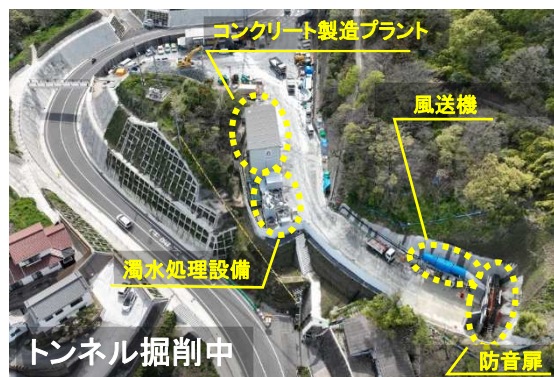

トンネル西側(平地区)の交差点工事について

鞆未来トンネルの西側（平地区）の交差点周りの工事について、下記のとおり契約しました。ブロック積工や舗装工事の際は通行規制が発生します。その際は事前に本紙面や工事看板等でお知らせします。今年度内のトンネル供用に向けて工事を進めて参りますので、ご理解とご協力をお願いします。


- 【施工業者】：(株) 水本組
- 【工期】：令和6年7月30日～令和7年3月31日（予定）
- 【工事内容】：ブロック積工 A=163m²、アスファルト舗装工 A=3,657m²

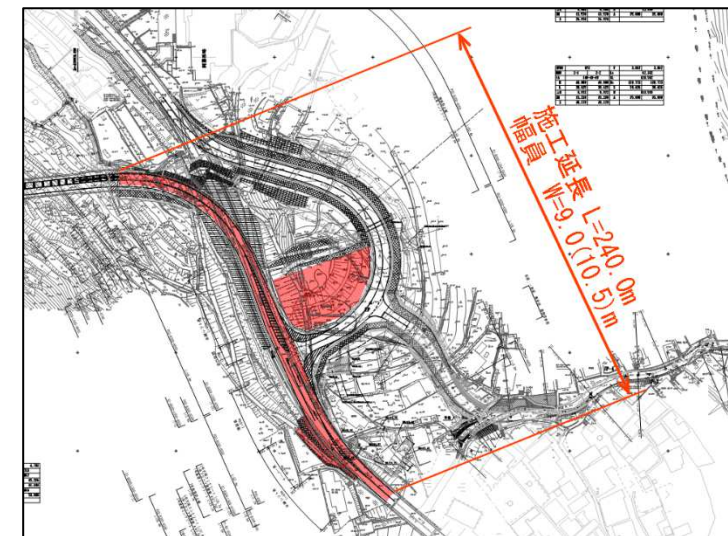

トンネル供用に伴う標識工事について

鞆未来トンネルの供用に伴い、付近に案内標識の新設・変更を行います。また、安全に通行してもらえよう交差点やカーブありなどの警戒表示や視線誘導標なども併せて設置することとしています。

- 【施工業者】：中国フレキ工業（株）
- 【工期】：令和6年8月21日
～令和7年3月31日（予定）
- 【工事内容】：大型標識設置 N=23基
警戒標識設置 N=12基
視線誘導標設置 N=400本

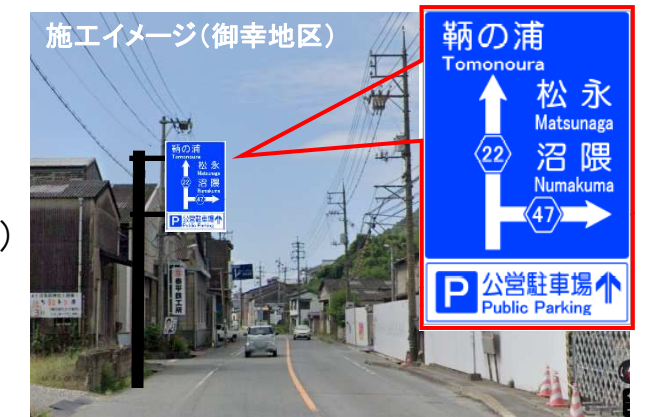

※「むろのき通信」は、広島県ホームページ【<https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/217/muronoki.html>】、福山市ホームページ【<https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/kowankasen/>】にも掲載しています。



西町地区の待避所について

西町地区（輛てらす付近）の待避所に入った際に、対向車が見えづらく感じることはありませんか？県では視距を確認するために道路反射鏡（カーブミラー）を下記の位置に設置しています。待避所に停止し対向車が見えづらい場合は、運転席から見て、右側後方の電柱に添架してある道路反射鏡をご確認ください。



道路の再美装化工事について【福山市 道路整備課】

美装化された道路について、老朽化によるガタツキや破損が生じているため、下水道整備等の完了した路線から道路の再美装化工事を行います。

工事期間中は、一時通行止め等の規制が伴います。皆様にご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。


【工事名】道路舗装工事(輛 58 号線)

【施工者】東洋建設(株)(輛町)

【工期】2024年(令和6年)7月30日
～2024年(令和6年)12月27日(予定)

※通行止め日時の詳細については、別途看板及び回覧版等でお知らせします。

【問合せ先】福山市建設局土木部道路整備課
電話 084-928-1081

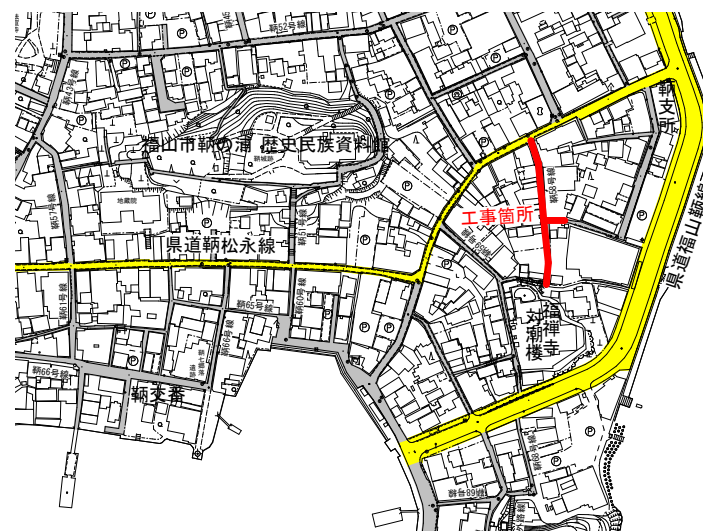

グリスロバス迂回路のお知らせについて【福山市 管路整備課】

下水道工事の交通規制に伴い輛の浦グリスロバスを次の通り、迂回路を通行することになりました。工事期間中は何かとご不便、ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

【迂回期間】2024年(令和6年)8月20日～2025年(令和7年)3月31日(延長の可能性あり)

※下水道工事完了次第、通常路線での運行となります。

(工事看板等でお知らせします)

【工事名】円形管理設工事(下水6-1)

【施工業者】(株)一瓢組

【問合せ先】福山市上下水道局工務部管路整備課

電話 084-928-1089

【運行会社】輛鉄道株式会社 福山営業所

電話 084-952-3100

【備考】時刻表及び停留所の変更はありません。

