

平成30年7月豪雨に伴い、広島市安佐北区落合南町において発生した土砂災害（土石流）に対して、広島県が緊急的に実施している災害関連緊急治山事業溪間工事の治山ダム本堤が完了しました。（令和2年7月6日）


引き続き、流域の安全度を高めるため洗掘防止対策等を実施し、工事が完成しました。（令和2年10月29日）

位置図



光掛山3

平面図

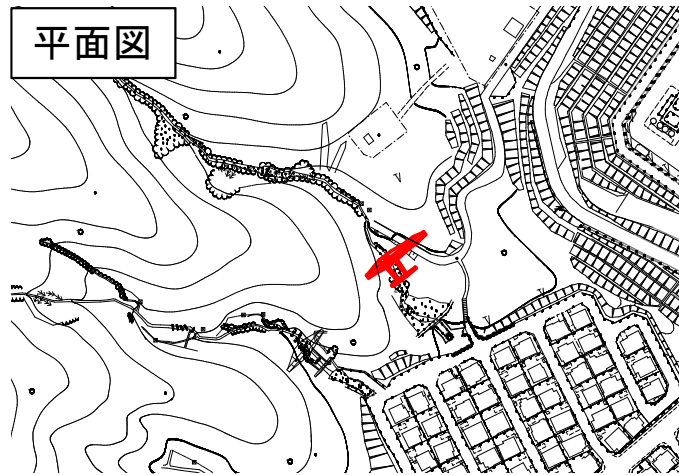

施工前



工事完成



被災状況



【被害状況】

土砂災害発生日：平成30年7月6日
土砂流入：市道（安佐北2区353号線）

【事業概要】

谷止工 1基 高さ7.0m, 幅41.0m, 体積863.5m³
事業費：約51,800千円

設計：（株）ミズキコンプライアンス
施工：（株）楠建

砂防・治山整備計画 事業箇所番号
④-③-19
