

平成30年7月豪雨に伴い、竹原市新庄町において発生した土砂災害（土石流）に対して、広島県が緊急的に実施している災害関連緊急治山事業溪間工事の治山ダム本堤が完了しました。（令和3年3月8日）


引き続き、流域の安全度を高めるため洗掘防止対策等を実施し、工事が完成しました。（令和3年12月2日）

位置図



西葛子

平面図

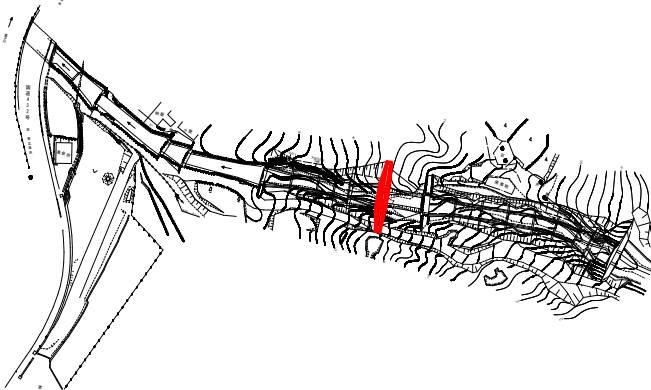

完成



被災状況



【被害状況】

土砂災害発生日：平成30年7月6日
土砂流入：人家，国道



【事業概要】

床固工 1基 高さ6.0m，幅25.0m，体積368.5m³
事業費：約 33,000千円



設計：（株）アキバ
施工：（株）山田組

砂防・治山整備計画 事業箇所番号

⑦-【1】-99
