


平成30年7月豪雨に伴い、安芸郡坂町小屋浦地内において発生した土砂災害（土石流）に対して、広島県が実施している再度災害防止事業について、計画された3基の砂防堰堤の内、3基目の堰堤本体工事が完了しました。（令和6年1月22日）引き続き、地域の安全確保のため、堰堤周辺部の工事を実施します。


位置図



平面図

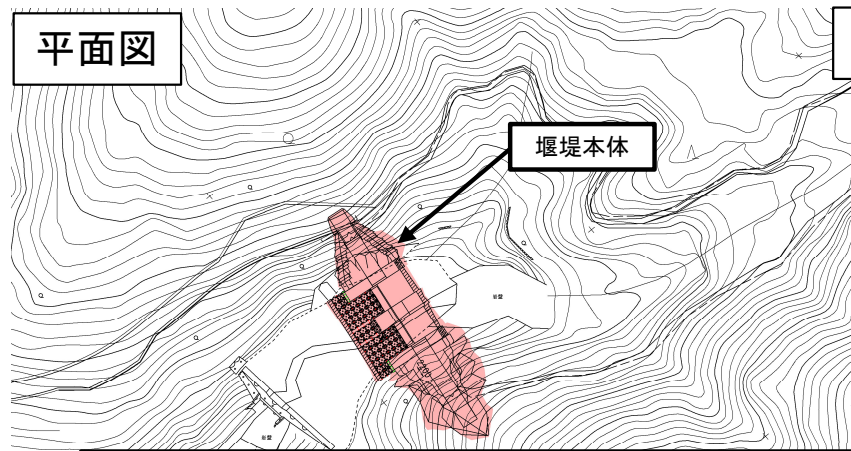

流域図

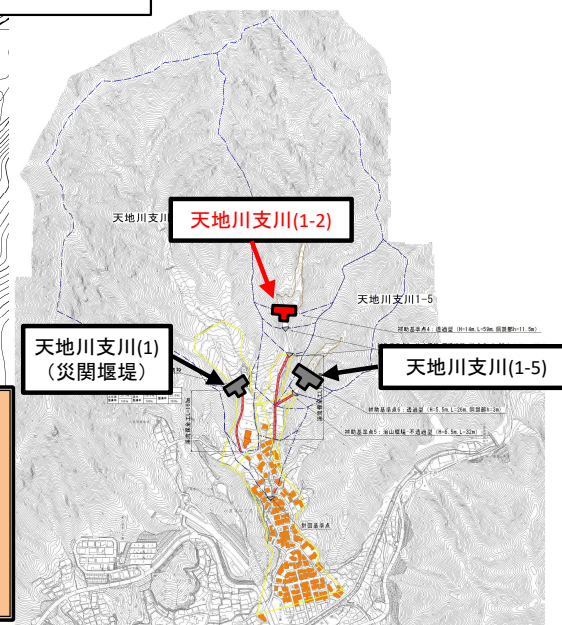

【事業概要】

保全対象：人家114戸，県道L=38m

主な対策：砂防堰堤 3基

- (1) 高さ14.5m，幅110.0m※完了済
- (1-2) 高さ13.0m，幅46.0m※今回完了
- (1-5) 高さ5.0m，幅31.0m※完了済

【被害状況】


土砂災害発生日：平成30年7月6日

死者・行方不明者：16名（小屋浦地区全体）

被災状況



堰堤一般図

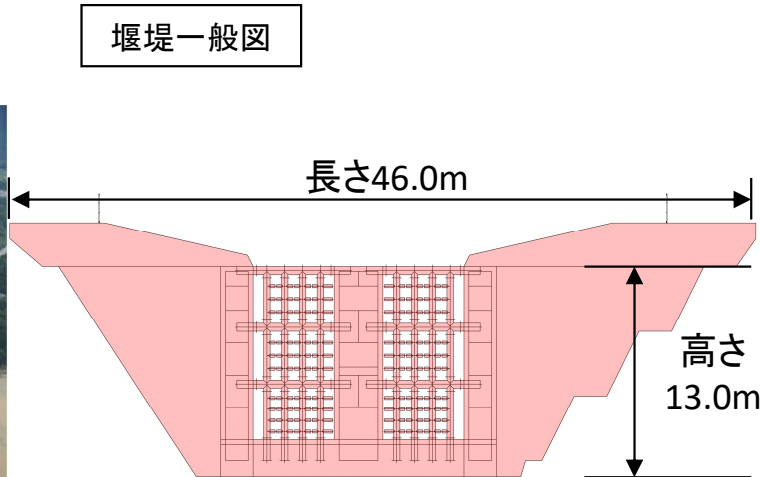

設計：株式会社荒谷建設コンサルタント
施工：株式会社鴻治組
発注：西部建設事務所

進捗状況



工事完了（令和6年1月22日）
