

平成30年7月豪雨に伴い、安芸郡坂町小屋浦において発生した土砂災害（土石流）に対して広島県が緊急的に実施している災害関連緊急砂防事業について、堰堤工事（本堤部）の工事が完了しました。（令和3年1月15日）引き続き、地域の安全確保のため、堰堤周辺部の工事を実施します。

位置図




【被害状況】

土砂災害発生日：平成30年7月6日
死者：5名
全壊：1戸

被災状況




平面図

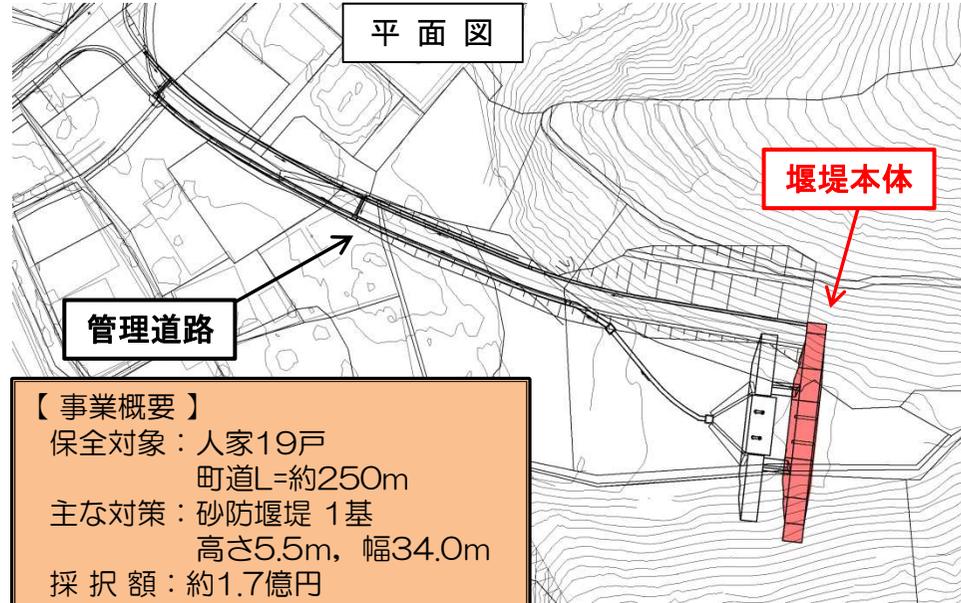

【事業概要】

保全対象：人家19戸
町道L=約250m
主な対策：砂防堰堤 1基
高さ5.5m，幅34.0m
採択額：約1.7億円

堰堤一般図

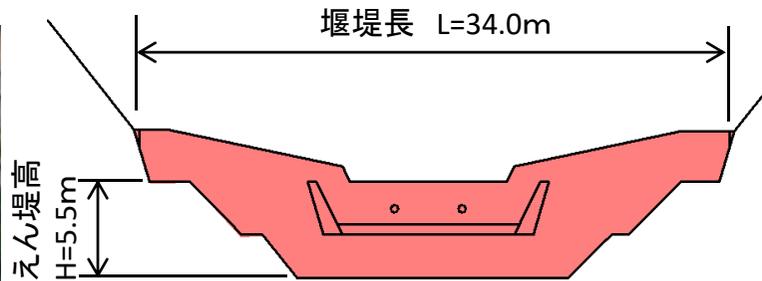

設計：株式会社オリエンタルコンサルタンツ
施工：宮川興業株式会社
発注：西部建設事務所

■進捗状況



工事完了（令和3年1月15日）
