

資料番号	3
------	---

令和5年1月19日  
 課名 土木建築局河川課  
 担当者 課長 三上  
 内線 3928

## 一級河川太田川水系三篠川災害復旧助成工事（4－3工区）における 工事請負契約の変更について

### 1 要旨・目的

令和2年9月定例会で契約締結の議決を受けた「一級河川太田川水系三篠川災害復旧助成工事（4－3工区）」について、契約の変更（工期延伸）を行う。

### 2 現状・背景

平成30年7月豪雨により甚大な浸水被害が発生した三篠川では、緊急的・集中的に治水機能の強化を図る災害復旧助成事業を活用して工事を進めている。

これまで、事業用地が取得できた区間から随時工事に着手するとともに、出水期間内においても作業制約のない堤内地側での作業を進めるなど、工期の短縮を図ってきたところであるが、事業用地の一部において、相続人が多数いたことや新型コロナウイルス感染症の拡大により対面交渉に制約を受けたことから用地取得に不測の時間を要し、一部区間において工事着手に遅れが生じたため、請負業者と協議を行い、12か月工期を延伸する。

### 3 概要

#### (1) 対象者

竹中土木・栗本三篠川 災害復旧助成工事（4－3工区）特定建設工事共同企業体

#### (2) 事業内容（工事概要）

ア 工事名：一級河川太田川水系三篠川災害復旧助成工事（4－3工区）

イ 工事場所：広島市安佐北区白木町小越<sup>おこえ</sup>～井原<sup>いばら</sup>

ウ 工事内容：工事延長L=2,680m

掘削工V=81,700m<sup>3</sup>、盛土工V=35,400m<sup>3</sup>、ブロック積工A=12,979m<sup>2</sup>

エ 請負金額：1,951,290,000円（税込）

オ 請負者：竹中土木・栗本三篠川 災害復旧助成工事（4－3工区）特定建設工事共同企業体

カ 工期：当初 令和2年10月7日から令和5年3月24日

変更 令和2年10月7日から令和6年3月25日（12か月延伸）

#### (3) スケジュール

工程表(当初)



工程表(変更)



#### (4) 予算（補助事業）

1,951,290,000円

(5) 今後の対応

令和5年2月定例会で請負契約の変更議案を提案するため、令和5年1月に仮契約を行い、議会承認後に本契約を行う。

4 その他

(1) 位置図

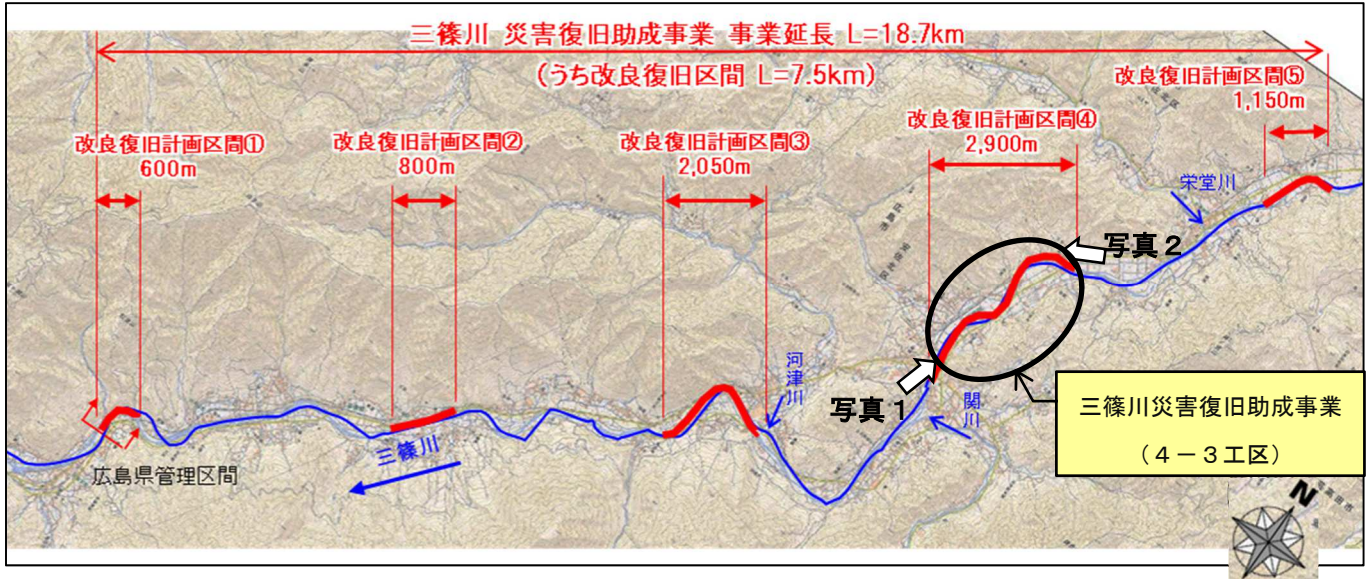


図1 三篠川災害復旧助成事業位置図

(2) 三篠川災害復旧助成事業について (概要)

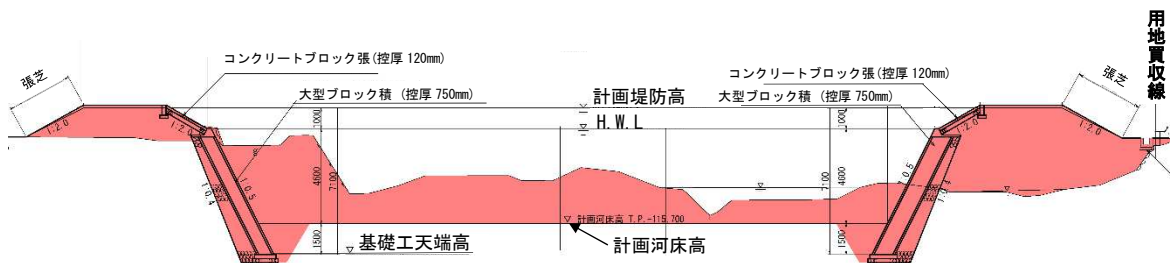


図2 河川改修イメージ



写真1 施工状況 (下流側)



写真2 施工状況 (上流側)
